GVG Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal

## Projekt Spange Ost — Gesamtprojekt

### Generelle Bemerkungen / Highlights

**Kommunikation**
- Die Grundeigentümer wurden im Januar 2026 um Unterschrift der Zustimmungserklärung gebeten. Die Gemeinden wurden über den Versand informiert.

grün

**Projektierung**
- Die Vernehmlassung bei den Gemeinden und involvierten Dritten hat stattgefunden. Die Rückmeldungen werden eingearbeitet.
- Folgende Punkte wurden an der 15. BBK (04.02.26) gutgeheissen.
  - Im Zusammenhang mit dem Bau des Schachts in Öniken Nord wurde eine garantierte Wasserherkunft angefragt. Damit die GVG ihre Ziele der Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz einhalten kann, kann sie keine Garantien zur Wasserherkunft in ihrem Netz machen. Sie garantiert aber weiterhin die Basisqualität.
  - Auftragsvergabe Planergemeinschaft, Bauherrenvertretung, Bauherrenunterstützung und Kommunikationsmandat bis SIA-Phase 41 (Ausschreibung).
  - E360° möchte die Realisierung der Zürcherstrasse (Kombiprojekt GVG/E360°) vorziehen. Ein Lösungsvorschlag wird erarbeitet.

grün

### Controlling

**Termine**
- Das Projekt befindet sich im vorgesehenen Terminplan.

grün

- Die Kosten stehen in angemessenem Verhältnis zum Projektierungsstand.

**Kosten**
- Der Kostenvoranschlag wurde erarbeitet und entspricht der Kostenschätzung aus dem Vorprojekt. Die Genauigkeit des Kostenvoranschlages beträgt +/- 10%.

grün

**Qualität**
- Keine Bemerkungen.

grün

**Umfeld**
- Informationen zu Drittprojekten werden laufend angefragt, insbesondere bei Änderungen der Linienführung.

grün

### Aktuelle Risiken

- Erforderliche Zustimmung der Grundeigentümer stellt ein Risiko für den Terminplan des Projektes dar.

### Ausblick

**Organisation**
- Die Projektkonstellation bleibt voraussichtlich bis Projektabschluss weiter bestehen.

**Bauarbeiten**
- Frühestmöglicher Baustart ist nach der Urnenabstimmung Q3 2027.

**Genehmigung**
- Das Bewilligungsprojekt startet ab Q1 2026.

**Termine**
- Das Bauprojektdossier ist im Abschluss.

**Kosten**
- Keine Bemerkungen.

**Qualität**
- Keine Bemerkungen.

## Projekt-Cockpit — per 28.02.2026

### Aktuelle Projektphase

| 31 Vorprojekt (Generelles Projekt) | 32 Bauprojekt (Auflageprojekt) | 33 Bewilligungs-verfahren | 41 Ausschreibung | 51 Ausführungsprojekt | 52 Ausführung | 53 Inbetriebnahme / Abschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|

### Meilenstein-Trendanalyse – Prognose für 2026

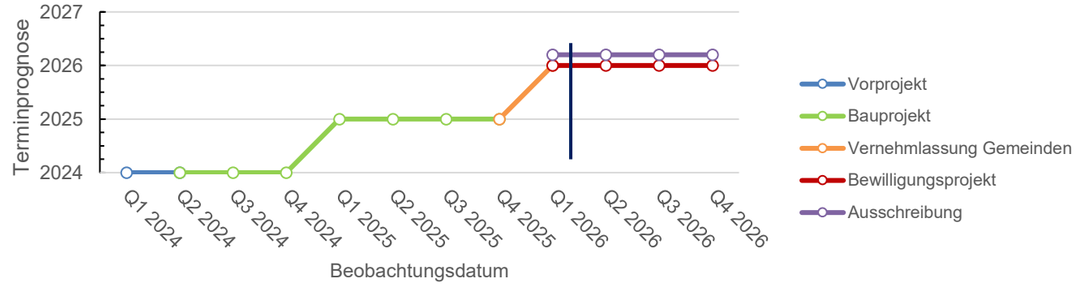


### Kostenentwicklung – Gesamt

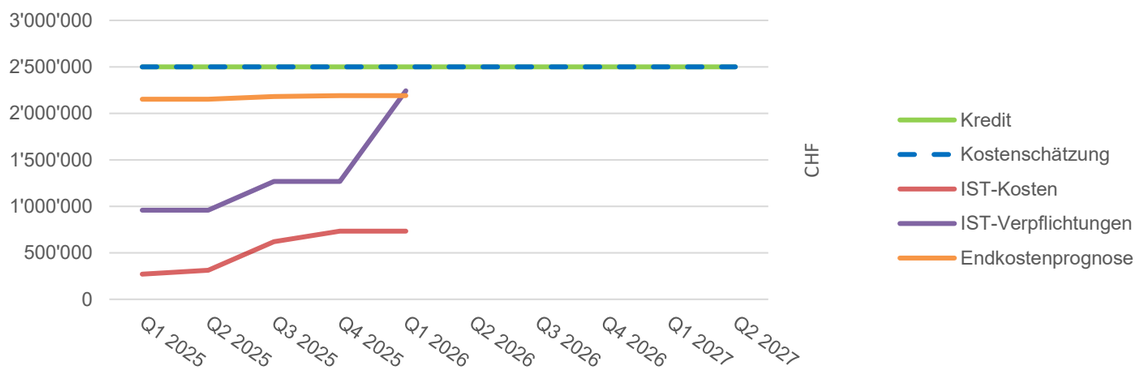


### Kostenübersicht per 28.02.2026 (Alle Angaben exkl. MwSt.)

| **Planungskredit** (exkl. Teuerung), Stichtag 02/2024 | **Planungskredit** (inkl. Teuerung), Stichtag 31.01.2026 | **Vertragsstand** Phasen 31-41 (IST-Verpflichtung) | **Abrechnung Vorprojekt** (Phase 31) | **Rechnungsstand gesamt** Phasen 31-41 (IST-Kosten) | **Endkostenprognose** inkl. Teuerung Stand 31.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF 2'500'000 | CHF 2’542’716 | CHF 2'191’881 | CHF 219’499 | CHF 732’896 | CHF 2’190’538 |
